

MINISTRE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DE LA
PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI



**RAPPORT D'EXECUTION DU FINANCEMENT EXTERIEUR
DU BUDGET SPECIAL D'INVESTISSEMENT (BSI)
AU 3^{ème} TRIMESTRE 2017**

décembre 2017

Table des matières

SIGLES ET ABREVIATIONS	2
I - RAPPELS	5
II - ETAT D'EXECUTION DU BSI 2017 du Financement Extérieur.....	5
1. Examen de la situation des réalisations effectuées au cours du 3 ^{ème} trimestre ...	5
a. Exécution du 1 ^{er} juillet au 30 septembre 2017	5
b. Situation des objectifs du 2 ^{ème} trimestre 2017	6
c. Situation d'exécution des cinq principaux bailleurs sur la même période....	7
2. Etat récapitulatif de l'exécution du BSI 1 ^{er} janvier au 30 septembre 2017	8
Graphique 3 : Situation d'exécution du 1 ^{er} janvier au 30 septembre 2017	8
III. Constats, Recommandations :	9
1. Constats :	9
2. Recommandation.....	9
ANNEXES	10

SIGLES ET ABREVIATIONS

BAD	: Banque Africaine de Développement
BCEAO	: Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest
BID	: Banque Islamique de Développement
BM	: Banque Mondiale
BOAD	: Banque Ouest Africaine de Développement
BSI	: Budget Spécial d'Investissement
CPS	: Cellule de Planification et de Statistique
CS	: Cour Suprême
CSA	: Commissariat à la Sécurité Alimentaire
DAF	: Direction Administrative et Financière
DFM	: Direction des Finances et du Matériel
DNPD	: Direction Nationale de la Planification du Développement
F CFA	: Franc de la Communauté Financière Africaine
FMI	: Fonds Monétaire International
HLF	: Hors Loi de Finances
IDA	: Association Internationale pour le Développement
LF	: Loi de Finances
MA	: Ministère de l'Agriculture
MAT	: Ministère l'Administration Territoriale
MATP	: Ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Population
MCI	: Ministère du Commerce
MDEAFP	: Ministère des Domaines de l'Etat, des Affaires Foncières Patrimoine
MDFL	: Ministère de la Décentralisation et de la Fiscalité Locale
MDHRE	Ministère des Droits de l'Homme et de la Réforme de l'Etat
MDJGS	: Ministère de la Justice, Garde des Sceaux ;
MEADD	: Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable
MED	Ministère de l'Equipement et du Désenclavement
MEE	: Ministère de l'Energie et de l'Eau
MEF	: Ministère de l'Economie et des Finances
MEFP	: Ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle
MEN	: Ministère de l'Education Nationale
MENC	: Ministère de l'Economie Numérique, et de la Communication
MEP	: Ministère de l'Elevage et de la Pêche

MESRS : Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
MHUAF : Ministère de l'Habitat de l'Urbanisme et des Affaires Foncières ;
MMEIA : Ministère des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration Africaine
MPFEF : Ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille
MSAH : Ministère de la Solidarité et de l'Action Humanitaire
MSHP : Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique
MT : Ministère des Transports ;
PTF : Partenaires Techniques et Financiers
PTI : Programme Triennal d'Investissement

INTRODUCTION

Le Mali a adopté le mécanisme de Programmation triennale glissante des Investissements Publics depuis 1988. A ce titre, la Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD) élabore chaque année le Programme Triennal d'Investissement (PTI) dont la tranche annuelle est le Budget Spécial d'Investissement (BSI). Le BSI est décomposé dans sa structuration en financement intérieur et extérieur.

Le présent rapport d'exécution, ne tenant compte que du financement extérieur du BSI, a été rédigé sur la base :

- de l'Instruction N°03 / MP-MFC du 3 Septembre 1990, relative au suivi trimestriel du BSI extérieur selon les procédures spécifiques ;
- des correspondances adressées aux Cellules de Planification et de Statistique (CPS), aux Directions des Finances et du Matériel (DFM) et aux Direction Administratives et Financière (DAF) dans le cadre de la collecte des données relatives à l'exécution du BSI extérieur au titre du 3^{ème} trimestre 2017 ;
- des données collectées à l'aide du canevas de suivi élaboré par la DNPD, renseigné et retourné par les gestionnaires de projets/programmes à travers les CPS, les DFM et les DAF des Institutions de la République ;
- des informations provenant de la Direction Générale de la Dette Publique (DGDP), pour ce qui concerne les tirages effectués sur les prêts.

Pour la collecte des données, des équipes ont été constituées au niveau de la Direction Nationale de la Planification du Développement en rapport avec les CPS, les DFM, et les DAF.

La situation d'exécution du 3^{ème} trimestre 2017 fait ressortir un taux de décaissement de **14,97 %** pour **30** projets/ programmes ayant fournis sur **54** projets/ programmes en exécution dans la Loi de Finances. Le présent rapport s'articule autour de trois (03) principaux points, à savoir :

I - Rappels ;

II - Etat d'exécution du BSI 2017 au 3^{ème} trimestre ;

III - Constats et recommandations.

I - RAPPELS

Le BSI 2017 constitue la 1^{ère} tranche annuelle du PTI 2017-2019 et observe par conséquent les mêmes procédures d'élaboration que celui-ci.

Le BSI 2017 regroupe tous les projets/ programmes en exécution sur financement intérieur et extérieur en 2017, ainsi que les nouveaux projets/ programmes devant démarrer au cours de l'exercice 2017.

L'enveloppe prévisionnelle du financement extérieur du BSI 2017 s'équilibre respectivement en ressources et en emplois à la somme de **284,600 milliards de F CFA** contre **260,744 milliards de F CFA** en 2016, soit une augmentation de **23,856 milliard de F CFA**. Cette enveloppe concerne 54 projets/programmes en cours d'exécution.

Le BSI 2017 est marqué par le démarrage et la poursuite d'importants projets/programmes, notamment dans les domaines routiers, pour le désenclavement intérieur et extérieur du pays, les projets d'aménagements hydro agricoles et d'élevage, de l'énergie et de l'eau, et le développement des services sociaux de base (santé, éducation et emploi...).

II - ETAT D'EXECUTION DU BSI 2017 du Financement Extérieur

L'état d'exécution du BSI 2017 du financement extérieur est présenté suivant les rubriques suivantes :

1. Examen de la situation des réalisations effectuées au cours du 3^{ème} trimestre

a. Exécution du 1^{er} juillet au 30 septembre 2017

Sur la base des données financières collectées par les CPS auprès des gestionnaires des projets/programmes, le cumul des décaissements du financement extérieur du 1^{er} juillet au 30 juin 2017 est de **42,592 milliards de F CFA** sur une dotation annuelle de **284,600 milliards F CFA**, soit un taux de décaissement de **14,97%**. Le taux d'exécution est relativement faible. **A la même période en 2016 le montant décaissé était de 61,652 milliards de F CFA pour un taux de 23,68%**.


Il faut signaler que trente (30) projets / programmes ont fourni leur situation d'exécution contre cinquante-quatre (54) projets /programmes qui n'ont pas renseigné le canevas.

La situation des ministères ayant enregistré les décaissements importants se présentent comme suit :

- ✓ le Ministère de l'Agriculture avec **12,166 milliards de F CFA** d'exécution sur une dotation de **114,250 milliards de F CFA**, soit **10,65%** ;
- ✓ le Ministère de l'emploi, de la formation professionnelle a décaissé **7,490 milliards F CFA** sur une dotation prévisionnelle de **5 milliards de F CFA** ;
- ✓ le Ministère de l'Energie et de l'Eau a effectué un décaissement total de **7,489 milliards de F CFA** sur une dotation totale de **63,631 milliards de F CFA**, soit un taux de **11,77%**.

Graphique 1 : Dotation et décaissement du 3^{ème} trimestre 2017.

(Montants en millions de F CFA)

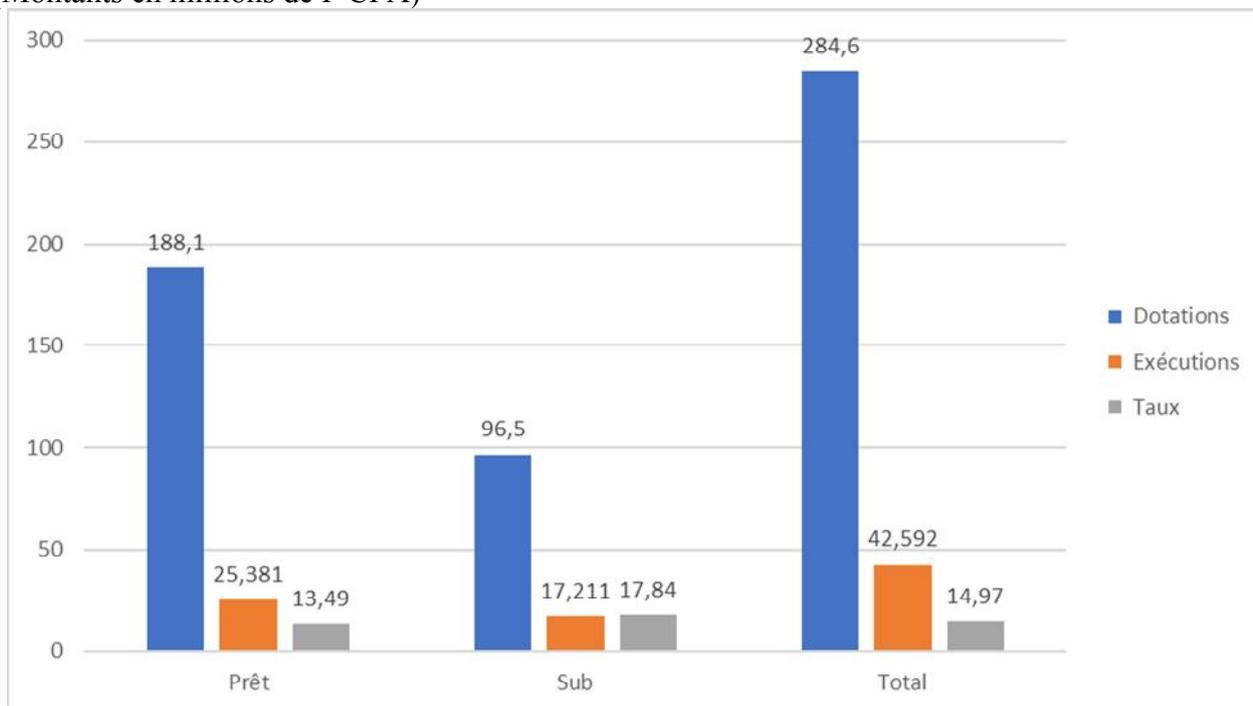

Source : DNPDP

La situation d'exécution du financement extérieur par nature se présente dans le tableau ci-dessous :

Tableau 1 : Situation du financement extérieur par nature des projets/programmes inscrits dans la Loi de Finances

(Montants en millions de F CFA)

Nature du Financement	Dotations BSI 2017	Décaissement	Taux de Décaissement (%)
Prêts	188,100	25,381	13,49
Subventions	96,500	17,211	17,84
Total	284,600	42,592	14,97

Source : DNPDP

b. Situation des objectifs du 2^{ème} trimestre 2017


Au titre du 3^{ème} trimestre 2017, la dotation estimative est de **85,500¹ milliards de F CAF** pour un décaissement de **42,592 milliards de F CFA**, soit un taux de **49,82%**. Pour rappel, au titre du 1^{er} trimestre le montant exécuté était de **102,205 milliards de F CFA** soit un taux de **121,09%**. Cette situation se décompose comme suit :

¹ Les estimations trimestrielles sont ainsi : 1^{er} T : 42, 500 soit 15% ; 2^{ème} T : 71,100 (25%) ; 3^{ème} T : 85,500 (30%) 4^{ème} T : 85,500 (30%) BN Gap du 1^{er} T : (13,306) est ajouté au 2^{ème} T

- ✓ les prêts ont été exécutés à hauteur de **25,381 milliards de F CFA**, sur une estimation de **56,500 milliards de F CFA** soit un taux **44,92 %** ;
- ✓ les subventions ont été exécutées à hauteur de **17,211 milliards de F CFA**, sur une estimation de **29,000 milliards de F CFA** pour un taux **59,35%**.

Au regard de cette situation, il ressort que les objectifs du trimestre n'ont pas été atteints. On constate un faible taux d'exécution par rapport au 2^{ème} trimestre dont les objectifs ont été dépassés à hauteur de 22%.

Graphique 2 : Situation d'exécution selon les objectifs du 3^{ème} trimestre 2017

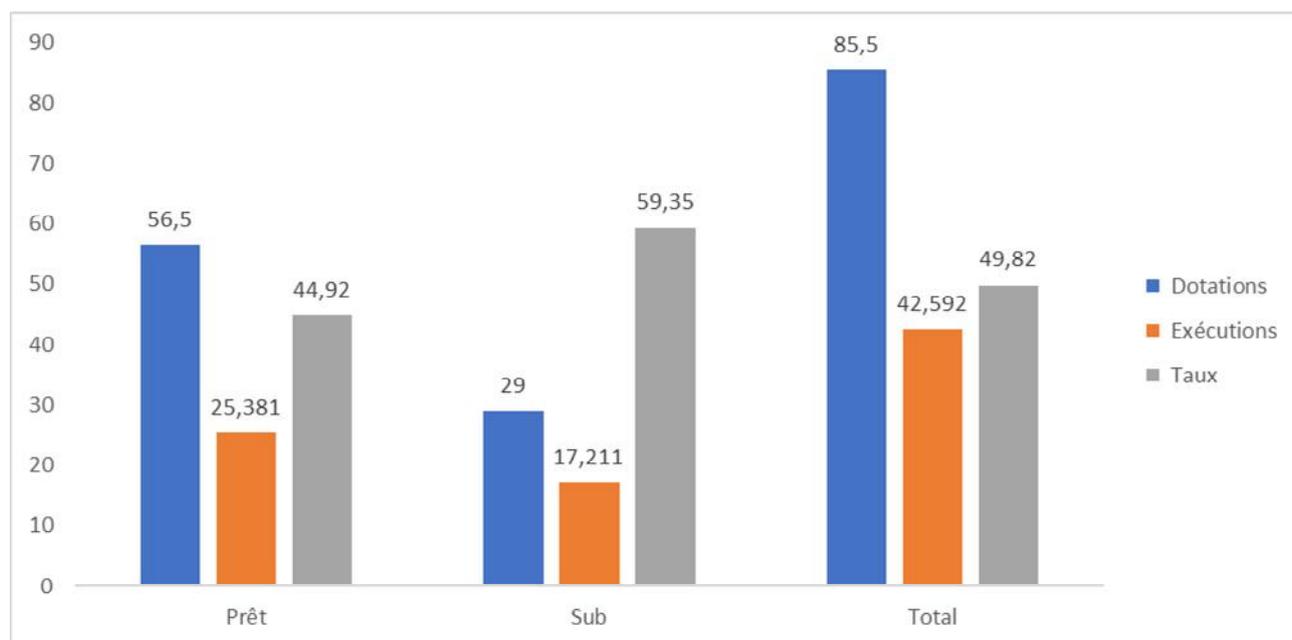

Source : DNP

c. Situation d'exécution des cinq principaux bailleurs sur la même période

Les décaissements enregistrés par bailleur se présentent comme suit dans le tableau ci-dessous :

Tableau 2 : Etat de décaissement au 30 juin 2017 des cinq principaux Bailleurs.

(Montants en millions de F CFA)

N°	Libelle	Nbre Ministère	Nbre de P/P	Dotation	Décaissement 1 ^{er} Trimestre	Décaissement 2 ^{ème} Trimestre	Décaissement 3 ^{ème} Trimestre	Décaissement	Taux d'exécution
1	BM /IDA	11	14	85 865	10 571	44 432	17 836	72 839	84,83
2	BAD/FAD	3	9	67 929	2 379	37 747	1 736	41 862	61,63
3	FED	2	2	9 500	6 895	6 895	1 142	14 932	157,18
4	BOAD	3	7	52 618	3 230	3 230	13 231	19 691	37,42
5	EXIM BANK	3	3	7 240	3 296	3 296	1 816	8 408	116,13
	Total	22	35	207 152	26 371	95 600	35 761	120 582	58,21

Source : DNPD

La situation d'exécution pour les 5 principaux bailleurs au cours de la période s'élève à **120,582 milliards de F CFA** sur une dotation totale de **207,152 milliards de F CFA**, soit un taux de **58,21%** de dotation prévisionnelle annuelle.

2. Etat récapitulatif de l'exécution du BSI 1^{er} janvier au 30 septembre 2017

La situation d'exécution du financement extérieur du 1^{er} janvier au 30 septembre est de **173,991 milliards de F CFA** sur une dotation de totale **284,600 milliards de F CFA** soit un taux de **61,14%**. Cette situation se décompose comme suit :


- ✓ les prêts ont été exécutés à hauteur de **112,902 milliards de F CFA**, sur une dotation prévisionnelle de **188,100 milliards de F CFA** soit un taux **60,02%** ;
- ✓ les subventions ont été exécutées à hauteur de **61,089 milliards de F CFA**, sur une prévision de **96,500 milliards de F CFA** pour un taux **63,30%**.

La situation des ministères ayant enregistré les décaissements importants se présentent comme suit :

- ✓ le Ministère de l'Agriculture avec **67,358 milliards de F CFA** d'exécution sur une dotation de **114,250 milliards de F CFA**, soit **58,96%** ;
- ✓ le Ministère de l'Energie et de l'Eau a effectué un décaissement total de **26,650 milliards de F CFA** sur une dotation totale de **63,631 milliards de F CFA**, soit un taux de **41,88%** ;
- ✓ le Ministère de l'Equipement, des Transports et du Désenclavement a décaissé **19,4902 milliards F CFA** sur une dotation prévisionnelle de **23 milliards de F CFA** ; soit un taux de **85,00%**.

Au regard de cette situation, le taux d'exécution à la date du 30 septembre est satisfaisant.

Graphique 3 : Situation d'exécution du 1^{er} janvier au 30 septembre 2017

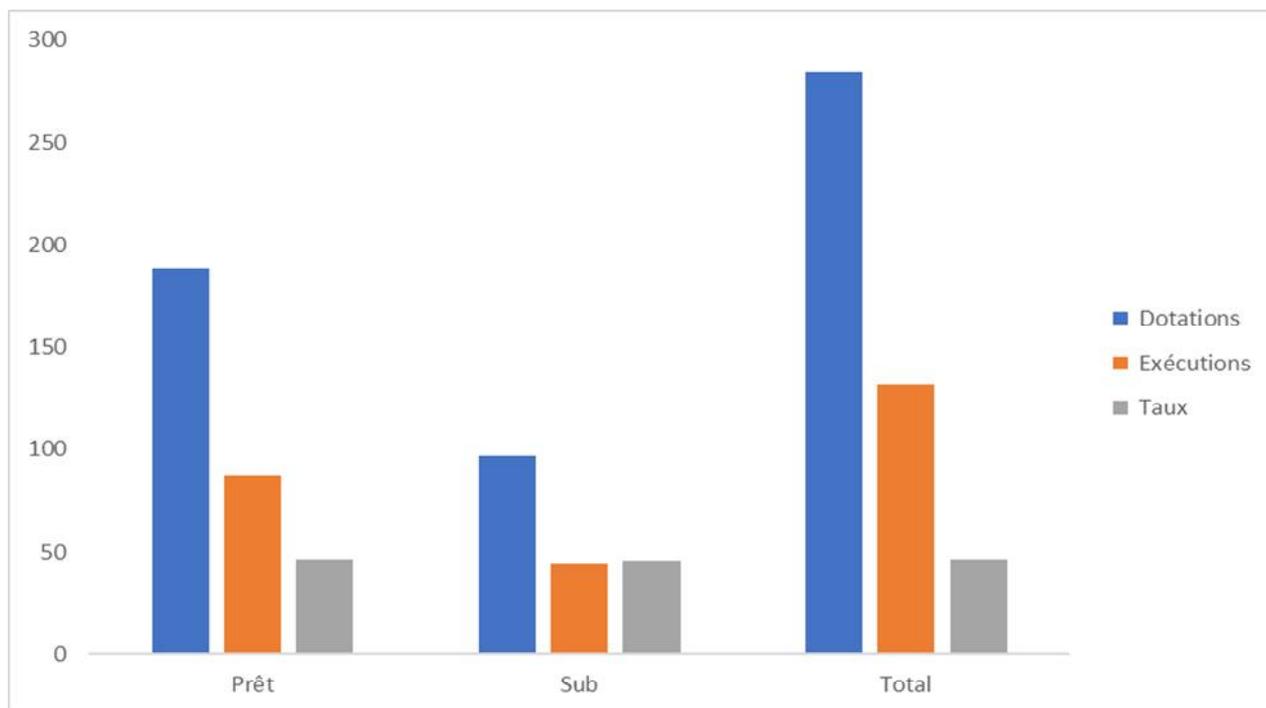

Source : DNPD

III. Constats, Recommandations :

1. Constats :

Au terme de l'exécution du financement extérieur du 3^{ème} trimestre 2017 des projets/programmes, les constats sont entre autres :

- ✓ les difficultés liées à la collecte des informations à temps, le retard dans la remontée des données collectées par certaines CPS et même auprès des gestionnaires des projets/programmes ;
- ✓ l'incohérence des informations relatives à certains projets/programmes selon la source des données (problème de fiabilité des données).

2. Recommandation.

Pour l'atteinte Il est demandé aux représentants des différentes CPS de veiller à l'atteinte des objectifs au 31 décembre.

ANNEXES

**ANNEXE N° 1 : Récapitulatif Global de la Situation des
financements extérieurs du BSI 2017**

3^{ème} Trimestre

**RECAPITULATIF DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI PAR MINISTERE/INSTITUTION
LOI DES FINANCES 2017**

N°	MINISTERES/ INSTITUTIONS	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2016	Dotation 2017			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 2ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux
1	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	8 916	IDA, Denmark	13 244	0	12 734	7 419	900	0	12 605	12 605	0	0	0	0	0	4 428	4 428	35,13	0,00	244,00	244,00	1,94	0	4 672	2 513	20
2	MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU DESENCLAVEMENT	119 434	ROAD, BID, OPEP, KOWEIT, Exim BANK, FED, BM	3 017	20 500	0	20 500	129 633	23 000	0	23 000	10 208	0	10 208	44	5 969	0	5 969	25,95	3 315	0	3 315	14,41	19 492	0	19 492	85
3	MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	0	KEEN, CHINE	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	231	231	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	231	231	12	
7	MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	60 650	IDA, IMF, PAPAM, FIDA	55 353	28 322	26 931	23 753	6 644	2 250	2 750	5 000	197	438	635	13	1 073	4 403	5 476	109,52	3 745	3 745	7 490	149,80	5 015	8 586	13 601	272
8	MINISTERE DE L'AGRICULTURE	288 161	EXIM BANK, OFID, FSD, KOREA, ROAD, BID, BM, FAD, BAD, BIOC, FICAB	346 402	172 779	31 279	204 058	150 406	96 723	17 527	114 250	8 130	565	8 695	7,61	42 154	4 343	46 497	40,70	10 786	1 380	12 166	10,65	61 070	6 288	67 358	58,96
9	MINISTERE DE L'ELEVAGE TE DE LA PECHE	22 500	BM, Belgique, BAD, BID	22 500	22 500	0	22 500	0	13 500	2 399	15 899	1 143	78	1 221	8	2 885	331	3 216	20,23	1 500	0	1 500	9	5 528	409	5 937	37
11	MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA Fiscalité Locale	4 930	Belgique	4 622	0	4 649	4 649	4 111	0	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
15	MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE	14 428	IDA	12 050	0	0	0	2 339	0	4 000	4 000	0	2 014	2 014	50,35	0	2 486	2 486	62,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4 500	4 500	112,50
17	MINISTERE DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	55 498	PNUD	2 200	0	2 200	2 200	2 036	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 000	1 000	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1 000	1 000	67
18	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	13 000	IDA, BID	38 622	0	38 622	38 622	2 477	2 000	5 500	7 500	0	1 375	1 375	18	201	2 191	2 392	31,89	100	2 489	2 589	34,52	301	6 055	6 356	85
19	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	15 500	0	15 500	7 000	9 500	16 500	4 052	0	3 000	3 000	0	750	750	25	195	1 675	1 870	62,33	0,00	1 055	1 055	35,17	195	3 480	3 675	123
20	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	277 604	IDA, ROAD, FAD, AFD, UE, BEL, BID, BAD, Coop Italie, KfW, UEMDA	274 170	194 561	74 609	269 170	60 565	47 515	16 116	63 631	1 342	2 067	3 409	5	8 079	7 673	15 752	24,76	5 935	1 554	7 489	11,77	15 356	11 294	26 650	41,88

N°	MINISTERES/ INSTITUTIONS	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2016	Dotation 2017			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 2ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux
21	MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	24 865	BM	24 865	24 865	0	24 865	576	0	3 500	3 500	0	0	0	0	1 776	0	1 776	50,7 4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776	0	1 776	51
22	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	0	IDA	41 000	0	37 500	0	5 263	3 112	8 404	11 516	0	864	864	8	4 169	5 318	9 487	82,3 8	0	6 744	6 744	59	4 169	12 926	17 095	148
23	MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR	985	PNLD	300	0	300	300	50	0	750	750	0	23	23	3	0	13	13	1,73	0	0	0	0	0	36	36	5
24	MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	258	Canada, UE	258	0	258	258	474	0	3 930	3 930	0	0	0	0	0	1 612	1 612	41,0 2	0	0	0	0	0	1 612	1 612	41
26	Cour Suprême	0	0	0	0	45	45	35	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL LOI DE FINANCES		906 729		854 103	470 527	238 627	634 839	431 602	188 100	96 500	284 600	21 020	8 174	29 194	10,26	66 501	35 704	102 205	35, 91	25 381	17 211	42 592	14,9 7	112 902	61 089	173 991	61,1 4

**ANNEXE N° 2 : Dotations / réalisations par
Ministères/Institution**

CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI du 3^{ème} TRIMESTRE 2017

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Montant en millions de F CFA

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2016	Dotation 2017			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 2ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux			
2923	Projet Elimination Pesticides Obsolètes	3 006	IDA	2 421	0	2421	2421	48	0	2500	2500	0	0	0	0	0	2000	2000	80	0	165	165	6.60	0	2165	2165	86.60
2924	Programme de Gestion et de Décentralisation des Forêts (GEDEFOR2)	4 334	Danemark	3 534	0	3534	2343	325	0	3 500	3 500	0	0	0	0,00	0,00	329	329	9.4	0	0	0	0,00	0	329	329	9.40
2261	Programme Régional Aménagement Massif Fouta Djallon	861	FAD-PNUD	330	0	70	81	166	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	19	19	1.267			0	0,00	0	19	19	1.27
2506	Projet Initiative Pauvreté Environnement		PNUD	150	0	150	150	361	0	1 500	1 500			0	0		0	0				0	0,00	0	0	0	0,00
2771	Projet Adaptation changement climatique Local/FENU		FENU	250					0	100	100	0	0	0	0	0	80	80	80	0	79	79	79,00	0	159	159	159,00
2919	Projet "drainage des eaux pluviales de Bamako"	715	KFW	6559	0	6559	2 424	0		3 505	3 505			0	0	0	2 000	2000	57,06	0,00	0,00	0	0,00	0	2000	2000	57,06
TOTAL LOI DE FINANCES		8 916	IDA, Danemark	13 244	0	12 734	7 419	900	0	12 605	12 605	0	0	0	0	0	4 428	4 428	35	0	244	244	2	0	4672	2513	19,94

CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI du 3^{ème} TRIMESTRE 2017
 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU DESENCLAVEMENT
Montant en millions de F CFA

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2016	Dotation 2017			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 2ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux			
2 561	Bitumage Route Goma Coura-Tombouctou	106 422	FED				0	39722	7500		7 500	5275		5275	70,33	2519	0	2519	33,59	2692	0	2692	35,89	10486	0	10486	139,81
			Exim Bank					76747	3 000	0	3 000	3 260		3260	108,67	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	3260	0	3260	108,67
	Sous Total	106 422		0	0	0	116469	10500	0	10 500	8535	0	8535	81,29	2519	0	2519	23,99	2692	0	2692	25,64	13746	0	13746	130,91	
2 821	Programme Aménagement d'Infrastructure Routière (PAIRE)	12	BOAD				9 271	8 000		8 000	247		247	3,09	2141	0	2141	26,76	623	0,00	623	7,79	3011	0	3011	37,64	
2 802	Aménagement 2x2 voies Section Route Segou - San 7 km	13 000	BOAD	3017			3 893	4 500		4 500	1 426		1426	31,69	1309	0	1309	29,09	0,00	0,00	0	0,00	2735	0	2735	60,78	
TOTAL LOI DE FINANCES		119 434	BOAD, BID, KOWINT, Exim BANK, FED,	3 017	20 500	-	20 500	129 633	23 000	-	23 000	10 208	-	10 208	44	5 969	0	5 969	26	3 315	-	331 5	14	19 492	-	19 492	85

CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI du 3^{ème} TRIMESTRE 2017
 MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA COMMUNICATION
Montant en millions de F CFA

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2016	Dotation 2017			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 2ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux			
3 040	Projet Technologique Infortion et Communication		KEXIM, CHINE					0	2000	2000	0	0	0	0	0	231	231	11,55			0	0	0	231	231	11,55	
TOTAL LOI DE FINANCES		0	KEXIM, CHINE	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	231	231	11,55	0	0	0	0,00	0	231	231	11,55	

CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI du 3^{ème} TRIMESTRE 2017

MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Montant en millions de FCF

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2016	Dotation 2017			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 2ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux
LOI DE FINANCES																											
2844	Projet d'Appui à la Formation Professionnelle, l'Insertion et l'Entreprenariat des jeunes ruraux (FIER)		FIDA	17 896	8 948	8 848	17 796	2139	1250	1250	2500	197	198	395	15,80	183	183	366	14,64			0	0	380	381	761	30,44
			PAPAM	4 633	0	4 633	4 633	0	0	0	0	0	74	74	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!			0	#DIV/0!	0	74	74	#DIV/0!
			IMF	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0	0	0	6	6	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!			0	#DIV/0!	0	6	6	#DIV/0!
	Total	28 150		23 853	10 272	13 481	23 753	2 139	1 250	1 250	2 500	197	278	475	19,00	183	183	366	14,64	0	0	0	0	380	461	841	33,64
2843	Projet de Renforcement des Compétences et Emploi des Jeunes (PROCEJ)	32 500	BM/IDA	31 500	18 050	13 450		4505	1000	1 500	2 500	0	160	160	6,40	890	4220	5110	204,4	3745	3745	7490	299,6	4635	8125	12760	510,40
TOTAL LOI DE FINANCES		60 650	IDA, IMF, PAPAM, FIDA	55 353	28 322	26 931	23 753	6 644	2 250	2 750	5 000	197	438	635	12,70	1 073	4 403	5 476	109,52	3 745	3 745	7 490	149,80	5 015	8 586	13 601	272

CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI du 3^{ème} TRIMESTRE 2017

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Montant en millions de F CFA

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2016	Dotation 2017			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 2ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution Cumulée				
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux
2 480	Programme De Développement De L'irrigation Dans Le Bassin Du Bani Et Du Selingue (PDI-BS)	110 730	EXIM BANK Chine	10 400			0	4470	2240	0	2240	36	0	36	1,61	2349	0	2349	104,87	1 816	0	1816	81,08	4 201	0	4 201	187,56	
			DFID	4 900			0	0	190	0	190	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	920	0	920	484,68	920	0	920	484,68	
			FSD	7 200			0	0	835	-	835	0	0	0	0,00	80	0	80	9,58	-	0	0	0,00	80	0	80	9,58	
			FKDEA	7 200			0	7887	339	0	339	190	0	190	55,98	0	0	0	0,00	-	0	0	0,00	190	0	190	55,98	
			BOAD	10 000			0	1500	218	0	218	1500	0	1500	70,81	0	0	0	0,00	-	0	0	0,00	1 500	0	1 500	70,81	
			BID.	5 430			0	5532	5410	-	5410	0	0	0	0,00	715	0	715	13,22	-	0	0	0,00	715	0	715	13,22	
			BADEA	14 490	0	0	0	7837	0	3379	3379	589	0	589	17,43	262	0	262	7,75	-	0	0	0,00	851	0	851	25,18	
			FAD/BOAD	38 510			0	21786	5101	0	5101	795	0	795	15,59	3280	0	3280	64,30	2 736	0	2736	53,64	6 811	0	6 811	133,53	
			BIDC.	5 000			0	2228	888	0	888	0	0	0	0,00	126,00	0	126	14,20			0,00	0,00	126	0	126	14,20	
	Sous Total	110 730		103 130	0	0	0	51 240	17 121	3 379	20500	3110	0	3110	15,17	6812	0	6812	33,23	5 472	0,00	5472	26,69	15 394	0	15 394	75,09	
2 602	Projet d'aménagement hydroagricole Molodo nord / BOAD phase une et phase une extasions		BOAD	17 500	17 500	8 000	25 500	13331	11 000	-	11 000	57	-	57	0,52	10 089	-	10 089	91,72	152	0	152	1,38	10 298	0	10 298	93,62	
2 640	Progr. Croiss Product. Agricole	74 100	IDA.	60 100	3 500	3 100	6 600	28066	3164	470	3634			0	0,00	2300	1470	3770	103,74	265	65	330	9,08	2 565	1 535	4 100	112,82	

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2016	Dotation 2017			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 2ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux			
																									Prêt	Subv	Total
	Sous Total	27 776	BAD	24 987	24 987	0	24 987	2868	6 333	3 167	9500	166	132	298	3,14	91,00	153,00	244	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	257	285	542	5,71
2 916	Projet de renforcement de la résilience a l'insécurité alimentaire au mali (PRIA_MALI)		BID Prêt	3 210	3 210	0	3 210	210	1440	0	1440	50	0	50	3,47	655,00	0,00	655	45,49	894,00	0,00	894,00	62,08	1 599	0	1 599	111,04
			BID: Instance ordinaire	3 255	3 255	0	3 255	51	1022	0	1022	0	0	0	0,00	125	0	125	12,23	129,00	0,00	129,00	12,62	254	0	254	24,85
			BID: Instance DJ	5 390	5 390	0	5 390	0	1000	0	1000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
			BID : ITC	11 275	11 275	0	11 275	10207	5038	0	5038	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	Sous Total	24 945		23 130	23 130	0	23 130	10 468	8 500	0	8 500	50	0	50	0,59	780	0	780	9,18	1023	0	1023	12,04	1 853	0	1 853	21,80
2 807	Projet De Renforcement De La Sécurité Alimentaire Par Le Développement Des Cultures Irriguées (PRESA-DCI)	29 064	FAD/BAD	26 919	25 316	1 603	26 919	2510	10 000	0	10 000	1143	67	1210	12,10	5650	92	5742	57,42	751,00	238,00	989	9,89	7 544	397	7 941	79,41
2 917	Projet De Renforcement De La Résilience Au Sahel (P2RS)	32 000	FAD/BAD	32 150	13 576	13 576	27 152	923	10 000	5 000	15 000	20	123	143	0,95	10006	0	10006	66,71	12	117	129	0,86	10 038	240	10 278	68,52
2 728	Projet D'appui A La Croissance Economique Et Promotion De L'emploi Par Le Secteur Prive (PACEPEP)	10 216	DANEMARK	9 716	0	0	-	1751	0	4 000	4 000	0	143	143	3,58	0	690	690	17,25			0,00	0,00	0	833	833	20,83
TOTAL LOI DE FINANCES MA		288161	EXIM BANK, OPRI, FSD, PROCA, BAD, BID, SM, FAD, BAD, BIDC, FIDAB, FEM	346402	172 779	31 279	204 058	150 406	96 723	17 527	114 250	8 130	565	8 695	7,61	42154	4343	46497	40,70	10786	1380	12166	10,65	61 070	6 288	67 358	58,96

CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI du 3^{ème} TRIMESTRE 2017

MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

Montant en millions de F CFA

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2016	Dotation 2017			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 2ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution au Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux
2 799	PROGRAMME REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS-MALI)	22 500	IDA	22 500	22 500	0	22 500	1924	10 000		10 000	1143	0	1143	11,43	2885	0	2885	29	1014	-	1014	10,14	5042	0	5042	50,42
2 798	Prjet de Développement Intégré des ressources Animales et Aquacoles au Mali (PDIRAAM)		BID				0	1924	3 500	-	3 500			0	0			0	-	285	-	285	8,14	285	0	285	8,14
2 643	PROJET DEVELOPPEMENT FILIERE AQUACOLE SIKASSO	4 873	Belgique	3 969	0	3 969	3 969		-	990	990	0	78	78	7,88	0	187	187	19	201		201	20,30	201	265	466	47,07
2 488	PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE DE ZEBU MAURE DANS LE CERCLE DE NARA (PRODEZEM)	5 775	Belgique	5 250	0	5 250	5 250	888	-	1 409	1 409	0	0	0	0	0	144	144	10			-	-	0	144	144	10,22
TOTAL LF MEP		22 500	BM, Belgique, BAD, BID	22 500	22 500	0	22 500	1924	13 500	2 399	15 899	1143	78	1221	8	2 885	331	3 216	20	1500	0	1500	9,43	5 528	409	5 937	37,34

CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI du 3^{ème} TRIMESTRE 2017

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA FISCALITE LOCALE

Montant en millions de F CFA

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2016	Dotation 2017			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 2ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux			
847	APPUI A LA MISE EN PLACE DES COMMUNES/ANIC		Belgique,					0	12 500	12 500			0	0,00			0,00	0,00			0	0,00	0	0	0	0,00	
TOTAL LOI DE FINANCES MDRE		4 930	Belgique,	4 622	0	4 649	4 649	4 111	0	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

CANEVAS DE SUIVI DU FANCEMENT EXTERIEUR DU BSI du 3^{ème} TRIMESTRE 2017

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE

Montant en millions de F CFA

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2016	Dotation 2017			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 2ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux			
LOI DE FINANCES																											
2 974	Renf. Santé de la Réproduction	14428	IDA	12050			0	2 339	0	4 000	4 000	0	2 014	2 014	50,35	0	2 486	2 486	62,15	0	0	0	0,00	0	4 500	4500	112,5
TOTAL LOI DE FINANCES		14428	IDA	12050	0	0	0	2 339	0	4 000	4 000	0	2 014	2 014	50	0	2 486	2 486	62,15	0	0	0,00	0	0	4 500	4 500	112,5

CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI AU 3ème TRIMESTRE 2017

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME, DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

Montant en millions de FCFA

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2016	Dotation 2017			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 2ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux			
1507	Plates Formes multifonctionnelles lutte contre la pauvreté	55 498	PNUD	2 200	0	2 200	2 200	2 036	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 000	1 000	67	0	0	0	0	0	1 000	1 000	66,67
TOTAL LOI DE FINANCES		55 498	PNUD	2 200	0	2 200	2 200	2 036	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 000	1 000	67	0	0	0	0	0	1 000	1 000	67

CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI AU 2ème TRIMESTRE 2017

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

Montant en millions de FCFA

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2016	Dotation 2017			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 2ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux			
2805	Programme d'urgence Education pour Tous		IDA	20 850	0	20 850	20 850	2 477	0	3 500	3 500	0	875	875	25	0	2 191	2 191	62,60	0,00	2 489	2 489	71,11	0	5555	5555	158,71
2973	Projet Appui à l'Education Bilingue de Base	13 000	Fond Saoudien	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	-	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
			BID	7 000	-	7 000	7 000	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	201	-	201	10,05	100	0	100	5,00	301	0	301	15,05
Sous Total		13 000		12 000	0	12 000	12 000	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	201	-	201	10,05	100	0	100	5	301	0	301	15,05
2650	Construction Equipement IFM au Mali		KFW	5 772	0	5 772	5 772	0	0	2 000	2 000	0	500	500	25	-	-	0	0	0	0,00	0	500	500	25,00		
TOTAL LOI DE FINANCES MEN		13 000	IDA, BID	38 622	0	38 622	38 622	2 477	2 000	5 500	7 500	0	1 375	1 375	18	201	2 191	2 392	31,89	100	2 489	2 589	34,52	301	6 055	6 356	84,75

CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI AU 3^{ème} TRIMESTRE 2017
 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Montant en millions de F CFA

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2016	Dotation 2017				Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux
2972	2865PROJET APPUI AU DEVELOPPEMENT ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	15 500	BM	15 500	7000	9500	16 500	4 052	0	3 000	3 000	0	750	750	25,00	195	1675	1870	62,33	0,00	1055	1055	35,17	195	3 480	3 675	122,50	
TOTAL LOI DE FINANCES		15 500		15 500	7000	9500	16 500	4 052	0	3 000	3 000	0	750	750	25	195	1675	1870	62,33	0	1055	1055	35,17	195	3 480	3 675	122,50	

CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI AU 3^{ème} TRIMESTRE 2017

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

Montant en millions de F CFA

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2016	Dotations 2017			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 2ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution Cumulée							
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux				
2668	Projet const centre national conduite de dédoublement capacité énergétique	22 489	BOAD	20 000	20 000	0	20 000	21974	5000		5000	0	0	0	0	41	0	41	0,82					-	0	41	0	41	0,82		
2975	Projet Electrification Rurale Système Hybrides 30 Villages		BAD				0	0	3500	0	3500			0	0,00	1750		1750	50,00					-	0	1750	0	1750	50,00		
2868	Projet appui promotion énergie renouvelable (PAPERM)	1 232	FAD	1 500		1 500	531	343	0	343	0	34	34	9,91	194	34	228	66,47	74	0	74	21,57	268	68	336	97,96					
2575	Projet AEP Bamako-Kabala	25 582	AFD	25 582	25 582	0	25 582	4427	1136		1136	97		97	8,54			0	0,00					-	0	97	0	97	8,54		
		11 807	UE	11 807	0	11 807	1397		3975	3975	0	70	70	1,76			0	0,00							-	0	0	70	70	1,76	
		32 797	BEI	32 797	32 797	0	32 797	6559	3550	0	3550	0	0	0	0,00			0	0,00							-	0	0	0	0,00	
		16 956	BID	16 956	16 956	0	16 956	0	349	0	349	0	0	0	0,00			0	0,00							-	0	0	0	0,00	
		40 000	BM	40 000	40 000	0	40 000	3378	1327	0	1327	814	0	814	61,34			0	0,00	5719	0	5719	430,97	6533	0	6533	492,31				
		38 000	BAD	38 000	38 000	0	38 000	2449	2049	0	2049	231	0	231	11,27	1641		1641	80,09							-	0	1872	0	1872	91,36
		7 215	Coop Italie	7 215	0	7 215	7 215	0		114	114	0	0	0	0,00			0	0,00							-	0	0	0	0,00	

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2016	Dotation 2017			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 2ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux			
	Sous Total	173 589		172 357	153 335	19 022	172 357	20235	8 411	4 089	12 500	1 142	70	1 212	9,70	1641	0	1641	13,13	5719	0	5719	45,752	8502	70	8572	68,58
2 577	Program. Nat de Mobilisation des Ressources en Eau /Assainissement AEP Centres Semi Urbains en 1ère, 2ème, 5ème et 6me régions.	19 128	KFW	18 581	-	18 581	18 581	4 984	-	4 177	4 177	-	-	0	-	-	194	194	4,64	-	271	271	6,49	0	465	465	11,13
2 996	Projet AEP et Accompagnement Centres Semi Urbains et Rureaux	10 500	AFD	8 000	2 500	10 500	13 000	0	0	300	300	0	92	92	30,67	0	170	170	56,67	-	0	0	0	262	262	87,33	
2 999	PROJET CONSTRUCTION LIAISON DOUBLE TERRE SIKASSO BOUGOUN		BID					0	2500	0	2500	0	0	0	0,00	241	185	426	17,04	-	0	0	241	185	426	17,04	
2741	Programme d'appui aux collectivités territoriales pour l'eau et l'assainissement PACTEA PHASE 2	20 469	FED	20 269	0	20 269	20 269	5 662	0	2 000	2000	0	1 620	1 620	26	0	3 266	3266	163	0	1 065	1 065	53,25	0	5951	5951	297,55
2795	Electrification villageoise Phase - Energie III	4 676	Inde	2 125	0	2 125	2 125	532	0	900	900	0	100	100	11	0	150	150	17	-	0	0	0	250	250	27,78	
2654	CONSTRUCT° STATION COMPACTE KALABAN KORO / BID		BID					0	1 911	0	1911			0				0	0			-	0	0	0	0	0,00

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2016	Dotation 2017			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 2ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux			
2869	Projet Système hybride électrification rurale SHER	255 21	IDA	2133 8	1872 6	261 2	21338	5717,16	7250	1250	8500	200	151	351	4,74	4125	1218	5343	62,8 6	142,0 0	218,0 0	360	4,24	4467	1587	6054	71,22
1730	ETUDES AMENAGEMENT BARRAGE DE TADUSSA		BOAD	10 000			930		18 600	3 400	22 000		-	-	87	2 456	2543	12			-	0	87	2456	2543	11,56	
TOTAL LOI DE FINANCES		277 604	BM BOAD, FAD, AFD, UE, BEL, BID, BAD, UEMOA,	274 170	194 561	74 609	269 170	60 565	47 515	16 116	63 631	1342	2 067	3 409	5,36	8079	7673	15752	24,7 6	5935	1554	7489	11,77	1535 6	11294	2665 0	41,88

CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI AU 3^{ème} TRIMESTRE 2017

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Montant en millions de F CFA

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2016	Dotation 2017			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 2ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux			
2 719	Projets filets sociaux JIGISEME JIRI/IDA	35 000	IDA	35 000	-	35 000		1 311	-	5 000	5 000				0,00	0,0 0	350 0	350 0	0,00	-	6 744	674 4	134,88	-	10 244	10 244	204,8 8
2 732	Projet de reconstruction		IDA					1 005	-	3 000	3 000		-	847	847	28,23	0,0 0	1436	1436	28,23		0	0,00	-	2 283	2 283	76,10

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2016	Dotation 2017			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 2ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux			
	Sous Total Ensemble projets PAT/MEF (RNP 2631 à 2638)	6 000		6 000	-	-	-	2 486	-	404	404	-	17	17	4,21	0	382	382	4,21	0,00	0,00	0	0,00	-	399	399	98,76
2 804	Projet d'Appui à la Gouvernance Economique/FA D		BAD /FA D			2 500		461	3 112	-	3 112	0	0	-	0,00	416 9	0,00	4169	0,00		0	0,00	4 169	-	4 169	133,97	
TOTAL LOI DE FINANCES			IDA	41 000	0	37 500	0	5 263	3 112	8 404	11 516	0	864	864	7,50	416 9	531 8	948 7	82,3 8	0	6744	674 4	58,56	4 169	12 926	17 095	148,4 5

CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI AU 3^{ème} TRIMESTRE 2017

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

Montant en millions de F CFA

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2016	Dotation 2017			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 2ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution Cumulée							
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux			
2938	Programme Appui Autonomisation Femmes Dividendes Démographique	24865	BM	24 865	24865	0	24865	576	0	3500	3500	0	0	0	0,00	1776		1776	50,74			0,00	0,00	1776	0	1776	50,74
TOTAL LOI DE FINANCES		24 865	BM	24 865	24 865	0	24 865	576	0	3 500	3 500	0	0	0	0,00	1 776	0	1 776	50,7 4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776	0	1 776	50,7 4

CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI AU 3^{ème} TRIMESTRE 2017

MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR et de L'INTEGRATION

Montant en millions de F CFA

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2016	Dotation 2017			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 2ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux			
2384	Appui au Programme Takten	985	PNUD	300	0	300	300	50	0	750	750	0	23	23	3	0	13	13	1,73			0,00	0,00	0	36	36	4,80
TOTAL LOI DE FINANCES		985	PNUD	300	0	300	300	50	0	750	750	0	23	23	3	0	13	13	1,73	0	0	0,00	0,00	0	36	36	4,80

CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI AU 2^{ème} TRIMESTRE 2017

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Montant en millions de F CFA

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2016	Dotation 2017			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 2ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux			
3045	PROJET APPUI SECTEUR JUSTICE AU MALI (PAJM)	100	Union Européenne	100	0	100	100	100	0	3 930	3 930	0	0	0	0	0	1 612	1 612	41	0	0	0	0	0	1 612	1 612	41,018
TOTAL LOI DE FINANCES		258	Canada, UE	258	0	258	258	474	0	3 930	3 930	0	0	0	0	0	1 612	1 612	41	0	0	0	0	0	1 612	1 612	41

CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI AU 2^{ème} TRIMESTRE 2017

COUR SUPREME

Montant en millions de F CFA

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2016	Dotation 2017			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 2ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2017				Etat d'Exécution Cumulée				
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux				
3058	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./SECT. COMPTE COUR SUPREME		BM			45	45	35	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL LOI DE FINANCES		0	0	0	0	45	45	35	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SOURCE DNPD
